



كلية العلوم الرباط
Faculté des sciences Rabat

Boutique ecommerce de parfums

Rayhana Fragrance

MODULE : METHODOLOGIES DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL
ENCADRANTE : SANAE EL MIMOUNI
FILIERE : SCIENCE DU LOGICIEL –
SEMESTRE 6 ANNEE UNIVERSITAIRE : 2024–2025

Partie 1 page de garde et rappel du projet

1) NOM DU PROJET : rayhanafragrance

2) Membre de l'équipe et rôle scrum :

rania benraihane : product owner, développeur front-end

ibtissam rattal : scrum master

nouhaila Aitari : développeur backend

3) Justification des rôles scrum :

Rania est désigné product owner car il possède une bonne compréhension des besoins des utilisateurs et est capable de prioriser les fonctionnalités du projet. Ibtissam est choisi comme scrum master car il est organisé et assure le suivi du travail de l'équipe ainsi que le respect des délais.

Rania et Ibtissam et Nouhaila sont du développement technique du site.

4) RAPPEL DU PROJET

Le projet consiste en la réalisation d'un site e-commerce de vente de parfums. Ce site permet aux utilisateurs de consulter un catalogue de produits, de s'inscrire, de se connecter et d'ajouter des articles au panier.

Les clients peuvent également passer des commandes en ligne de manière simple et rapide.

Remarque très importante :

Initialement, le projet était planifié sur 3 sprints.

Cependant, après réévaluation du périmètre et de la charge de travail, le Sprint 2 a été supprimé et certaines User Stories ont été déplacées vers le Sprint 3 afin d'optimiser l'organisation du projet.

5) Synthèse du livrable 2 (WBS)

Durée totale prévue :3mois

Nombre de sprints envisagé : 2 SPRINTS

Vélocité initiale estimée :23points par sprint

Partie2 product backlog initial

▼

Sprint 1

Ajouter des dates

(6 tickets)

24

0

0

Démarrer un sprint

...

RAYH-1

En tant que client, je veux créer un ...

À FAIRE ▼

3

NA

...

RAYH-2

En tant que client, je veux me conn...

À FAIRE ▼

3

IR

RAYH-3

En tant que client, je veux recherch...

À FAIRE ▼

5

RAYH-4

En tant que client, je veux filtrer les ...

À FAIRE ▼

5

RAYH-5

En tant que client, je veux choisir le ...

À FAIRE ▼

3

RAYH-6

En tant que client, je veux ajouter u...

À FAIRE ▼

5

▼

Backlog

(6 tickets)

22

0

0

Créer un sprint

RAYH-7

En tant que client, je veux supprime...

À FAIRE ▼

3

RAYH-8

En tant que client, je veux confirme...

À FAIRE ▼

5

RAYH-9

En tant que client, je veux contacter...

À FAIRE ▼

3

RAYH-10

En tant que client, je veux ajouter ...

À FAIRE ▼

3

RAYH-11

En tant qu'administrateur, je veux ...

À FAIRE ▼

5

RAYH-12

En tant qu'administrateur. ie veux ...

À FAIRE ▼

3

Partie3 planification des sprints

3,1)vue d'ensemble des releases et sprints

sprint	Période	Sprint goal	Us incluses	Total pts
Sprint1	Sem1- Sem2	Mettre en place les fonctionnalités	Us-1 ,us-2 ,us-3 US-4 US-5	24

		principales du site	US-6	
Sprint2	Sem 3- Sem4	Finaliser la gestion des commandes et administration	US-7 ,us-8 US-9 us-10 Us-11 US-12	24

3 ,2)les sous tache du sprint1

SOUS TACHE1

Tickets		Priori	Per
RAYH-14	Créer la page inscription	=	NA
RAYH-15	Vérifier les champs du...	=	B
RAYH-16	Enregistrer les utilisateurs dan...	=	IR

SOUS TACHE 2

Tickets		Priori	Per
RAYH-17	Créer la page de connexion	=	NA
RAYH-18	Vérifier email et le mot de passe	=	IR
RAYH-19	redirection après connexion	=	B

Tickets		Priori	Persc
RAYH-25	Créer les catégories...	=	B
RAYH-26	Ajouter le filtre par...	=	IR

SOUS TACHE3

Tickets		Priori	Per
RAYH-20	Ajouter une barre de...	=	NA
RAYH-21	Afficher les résultats des...	=	B
RAYH-22	Connecter a la recherche a Is...	=	IR

Tickets		Priori	Perso	Éta
RAYH-23	ajouter le filtre et le...	=	NA	À F
RAYH-24	Afficher produits...	=	IR	À F

Tickets		Priori	Perso	Éta
RAYH-27	créer le panier	=	IR	

Tickets	Priori	Persc
RAYH-27 créer le panier	=	IR

3 , 3)SPRINT BACKLOG D2TAILL2 DU SPRINT 3 dans jira(sprint 2)

Tickets	Priori	Persc
RAYH-28 Ajouter fonction...	=	NA
RAYH-29 Mettre a jour le total du...	=	IR

Tickets	Priori	Persc
RAYH-30 Créer page confirmati...	=	B
RAYH-31 Enregistrer les...	=	NA

Tickets	Priori	Persc
RAYH-33 Créer formulaire...	=	NA
RAYH-34 Envoyer message a...	=	B

Tickets	Priori	Persc
RAYH-35 Ajouter système d...	=	NA
RAYH-36 Afficher commentai...	=	IR

Tickets	Priori	Persc
RAYH-37 Page administrat...	=	B
RAYH-38 Ajouter produit...	=	NA

Tickets	Priori	Persc
RAYH-40 Supprimer produit...	=	IR
RAYH-41 Mise à jour catalogue...	=	IR

PARTIE4)sprint planning

Participants et durée Product Owner : ÉtudianteScrum Master

:ÉtudianteÉquipe de développement : Rania, ibtissam, nouhaila

Durée de la réunion :1h30

User Stories sélectionnées et justificationPour le Sprint 1, l'équipe a sélectionné les User Stories suivantes :US-01

Inscription utilisateurUS-02

Connexion utilisateurUS-03

Recherche de parfumsUS-04

Filtrer les produits par prix

Justification du choixCes

User Stories ont été choisies car

:Elles représentent les fonctionnalités essentielles (MVP) du site e-commerce.Elles permettent à l'utilisateur de :

s'authentifier

rechercher des produits

filtrer les résultats

gérer un panier

Elles sont classées comme Must Have selon la priorité MoSCoW

Elles assurent le bon démarrage du système avant les fonctionnalités avancées

Sprint Goal

Mettre en place les fonctionnalités principales permettant à un utilisateur de s'inscrire, se connecter, rechercher et filtrer des parfums, et ajouter des produits au panier.

Risques et points bloquants

Difficulté de connexion entre frontend et backend (API)

Gestion de la base de données au début du projet

Complexité du filtre (prix + type de parfum)

Coordination entre les membres de l'équipe

4,2) EXEMPLE DE DAILY SCRUM

MEMBRE	Qu'ai-je fait hier	Que vais-je faire aujourd'hui	blocages
Rania	Creation page d'inscription	Ajouter filtre prix	Aucun
ibtissam	Affichage produits	Recherche+affichage résultats	Problème css
nouhaila	API login	API panier	Difficulté connexion DB

4,3) SPRINT REVIEW

Sprint Review (Sprint 1)

Fonctionnalités livrées (DoD respectée)

Inscription et connexion utilisateur (US-01, US-02)

Recherche de parfums (US-03)

Filtre par prix et type (US-04, US-05)

Ajout au panier (US-06)

Fonctionnalités non terminées

Toutes les User Stories du Sprint 1 ont été complétées (aucun blocage majeur)

Retours du Product Owner

Site simple et fonctionnel

Bonne recherche et filtrage

Améliorer le design du panier

Ajouter plus de tests dans le Sprint 2

Vélocité du Sprint

Story Points prévus : 24

Story Points réalisés : 24

Sprint réussi à 100%

4,4)SPRINT R2TROSPECTIVE

Start (Ce qu'il faut commencer à faire)

Faire des tests plus fréquents pendant le développement

Mieux organiser la communication entre frontend et backend

Documenter les fonctionnalités au fur et à mesure

Utiliser Jira de manière plus détaillée pour chaque tâche

Stop (Ce qu'il faut arrêter de faire)

Ajouter des fonctionnalités sans validation préalable

Travailler sans coordination entre les membres

Reporter les tests à la fin du sprint

Modifier le code sans mise à jour du suivi Jira

 Continue (Ce qu'il faut continuer à faire)

Bonne répartition des tâches entre les membres

Respect des délais du sprint

Utilisation du travail en équipe

Avancement régulier des user stories

Partie 5


5,1)définition of ready (DoR)

<u>Critère</u>	<u>dimension</u>
<u>User Story est rédigée au format standard :</u> <u>« En tant que..., je veux..., afin de... »</u>	<u>Compréhension fonctionnelle</u>
Les critères d'acceptation sont clairs et testables	<u>Qualité fonctionnelle</u>
L'estimation en story points est définie	<u>Planification estimation</u>
dépendances éventuelles sont identifiées	<u>Gestion technique</u>
<u>User Story est comprise et validée par toute l'équipe</u>	<u>Alignement équipe</u>

5,2) Definition of Done (DoD)

<u>Critère</u>	<u>dimension</u>
<i>Le code est développé et fonctionnel</i>	développement
<i>Le code est revu par un autre développeur (peer review)</i>	Qualité du code
<i>Les tests unitaires sont exécutés avec succès</i>	tests
<i>La fonctionnalité fonctionne sans bugs majeurs</i>	Qualité fonctionnelle
<i>L'intégration frontend/backend est réussie</i>	Intégration système
<i>La fonctionnalité est validée sur l'environnement de test</i>	Validation/déploiement

6,1)Suivi ets indicateur

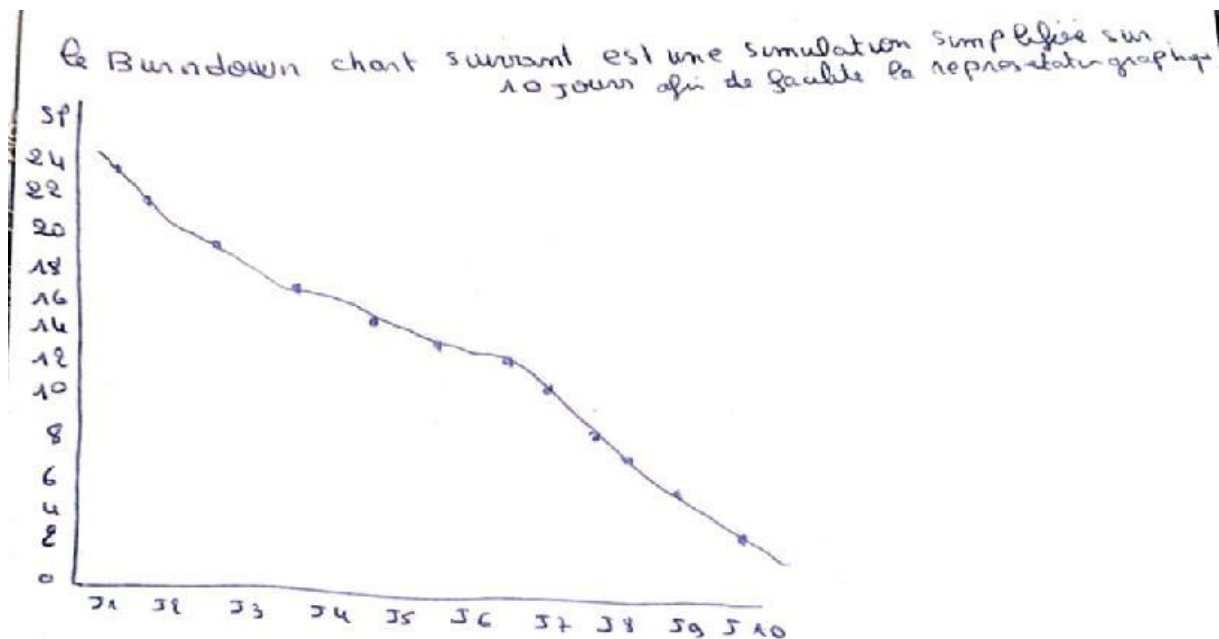

6,2)outil de gestion de projet

Lien de jira est:

Dans jira on trouve :

product backlog ,sprints planifiés ,sprint backlog,
suivi des taches(TO DO,IN PROGRESS, DONE)

6,3)

Risque identifié	Mesure de mitigation
Mauvaise répartition du travail entre les membres de l'équipe	Répartition claire des tâches sur jira+suivi quotidien(Daily scrum)
Retard dans certaines user stories a cause de la complexité technique	Priorisation des fonctionnalités must have+découpage tâches en petites sous tâches

Lien de JIRA : <https://home.atlassian.com/o/f92926d0-6567-4f0d9d4001455c4b0ef7/people/team/6dc175bb->

[1066-4779-b4f0-a70e5ea05c70?cloudId=14f88ff2-4067-48a0-a66b-ccf79d3a871f](#)
