



كلية العلوم الرباط
Faculté des sciences Rabat

Boutique ecommerce de parfums

Rayhana fragrance

MODULE : METHODOLOGIES DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL
ENCADRANTE : SANAE EL MIMOUNI
FILIERE : SCIENCE DU LOGICIEL –
SEMESTRE 6 ANNEE UNIVERSITAIRE : 2024–2025

Livrable séance 2

Ibtissam Rattal-Ranya Benraihane-Nouhaila Aitari

Livrable 1 :

Contexte :

Situation actuelle

Les boutique offline ne visaient pas beaucoup de client car ils etaient dans un endroit fixe mais

problème résolu

maintenant les plateformes en ligne visent plus de monde partout

valeur ajoutée chiffrée

acheter des produit sans se deplacer

gagner du temps pour le client

2-Parties prenantes :

Acteur	Besoin	Rôle	implication
Client	Acheter facilement en ligne	Commander des produits	Interface simple et intuitive, recherche rapide des produits, panier d'achat, paiement sécurisé, suivi des commandes
Client fictif	Vendre des produits en ligne	Fournir des produits	Gestion du catalogue, ajout/modification des produits, gestion du stock et des commandes
admin	Gérer la plateforme	Superviser les utilisateurs, produits et commandes	Gestion des comptes utilisateurs, contrôle des produits, validation/suppression des contenus, suivi des ventes et statistiques
Equipe projet	Responsable sur le développement de la plateforme	Dev /test	Gestion des comptes utilisateurs, contrôle des produits, validation/suppression des contenus, suivi des ventes et statistiques
Système de livraison	Assurer la livraison des commandes	Transporter les produits aux clients	Gestion des expéditions, suivi des livraisons, mise à jour du statut des commandes, respect des délais de livraison

3-Périmètre (MoSCOW)

Must :

Inscription

Connexion

Catalogue des produits

Panier

Should :

Recherche de produits

Paieement en ligne

Notifications email

Could :

Liste de favoris

Avis clients

Won't :

Application mobile

4. Contraintes

- Technique : développement d'une application web (HTML, CSS, JavaScript)
- Délai : durant le semestre s6
- Sécurité : protection des données personnelles des utilisateurs.

Dépendances externes

Serveur d'hébergement

- [GitHub](#)
- [Hostinger](#) ou wampserver

Le site dépend des services d'hébergement pour être accessible en ligne.

Connexion Internet

Le fonctionnement du site nécessite une connexion Internet stable pour :

- accéder au site ;
- effectuer les commandes ;
- envoyer les données

Risques du projet

Piratage du site

Le site peut être victime :

d'attaques informatiques ;

du vol de données ;

de modification non autorisée du contenu.

Solutions possibles :

utiliser HTTPS ;

sécuriser les mots de passe ;

effectuer des sauvegardes régulières.

6. Cas d'utilisation

Cas 1 :

Acteur : client

Précondition : le client doit être connectée et le site doit contenir des produits

Déroulement : Le client saisit son email et mot de passe puis se connecte

Résultat : Accès à l'espace utilisateur

Cas d'erreur : Identifiants incorrects

Cas 2 :

Passer une commande

Acteur : Client

Précondition : ajouter des produits préférés au panier

Déroulement : Consultation du panier et validation et confirmation de la commande

Résultat : Commande enregistrée avec succès

Cas d'erreur : produit indisponible

Cas 3 :

Gérer les produits

Acteur : Administrateur

Précondition : Admin connecté

Déroulement : il peut ajouter et modifier et supprimer un produit

Résultat : Mise à jour du catalogue

Cas d'erreur : Erreur de saisie ou problème de base de données

7. Architecture technique

Architecture en 3 couches :

Frontend :HTML, CSS, JAVASCRIPT

Justification : Permet d'afficher des produits , des paniers ,ajouter un style et une cohérence, et rendre le site dynamique...

Backend :php

Justification : Le traitement logique des données et la sécurité

Base de données : MySQL

Justification : Stocker les données

8-Risques :

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Panne d'hébergement	Moyenne	Élevée	Utiliser un bon hébergement
Perte de donnée	faible	Élevée	Sauvegarde les données régulières
Problème de paiement	moyenne	élevée	Utiliser des sites de paiements fiables
Retard de projet	élevée	moyen	Respect de planning
Les bugs	élevée	moyenne	Faire des tests régulièrement

9. Glossaire

- 1) **Utilisateur.** Personne qui utilise la plateforme pour acheter les produits
- 2) **produit.** Les articles mis en vente sur la plateforme
- 3) **panier.** Espace où l'utilisateur regroupe les produits avant achat
- 4) **commande.** Action de validation d'achat
- 5) **paiement.** Processus de règlement de la commande en ligne
- 6) **administrateur.** Personne qui gère le site
- 7) **client.** Utilisateur qui effectue des achats
- 8) catalogue liste des produits disponibles sur le site

10. Hypothèses et exclusions

Hypothèses

Les utilisateurs disposent d'une connexion Internet.

Les produits sont disponibles en stock.

Exclusions

Application mobile non incluse

11. KPIs

Temps de réponse < 3 secondes

Disponibilité du système $\geq 95\%$

Nombre de commandes réussies

Nombre d'utilisateurs actifs

Taux de satisfaction $\geq 80\%$


12. Planification macro



- S1 – S2 : Analyse des besoins et etudier le projet
- S3 – S4 : conception +ARCHITECTURE
- S5 – S7 :développement frontend
- S8 – S10 : Développement backend +base de donnée
- S11 – S12 : test et Finalisation

13. Critères de succès

1. Fonctionnalités complètes
2. Site fonctionnel et sans erreurs majeures
3. Temps de réponse rapide
4. Interface simple et utilisable
5. Validation par utilisateur

14. Wireframes

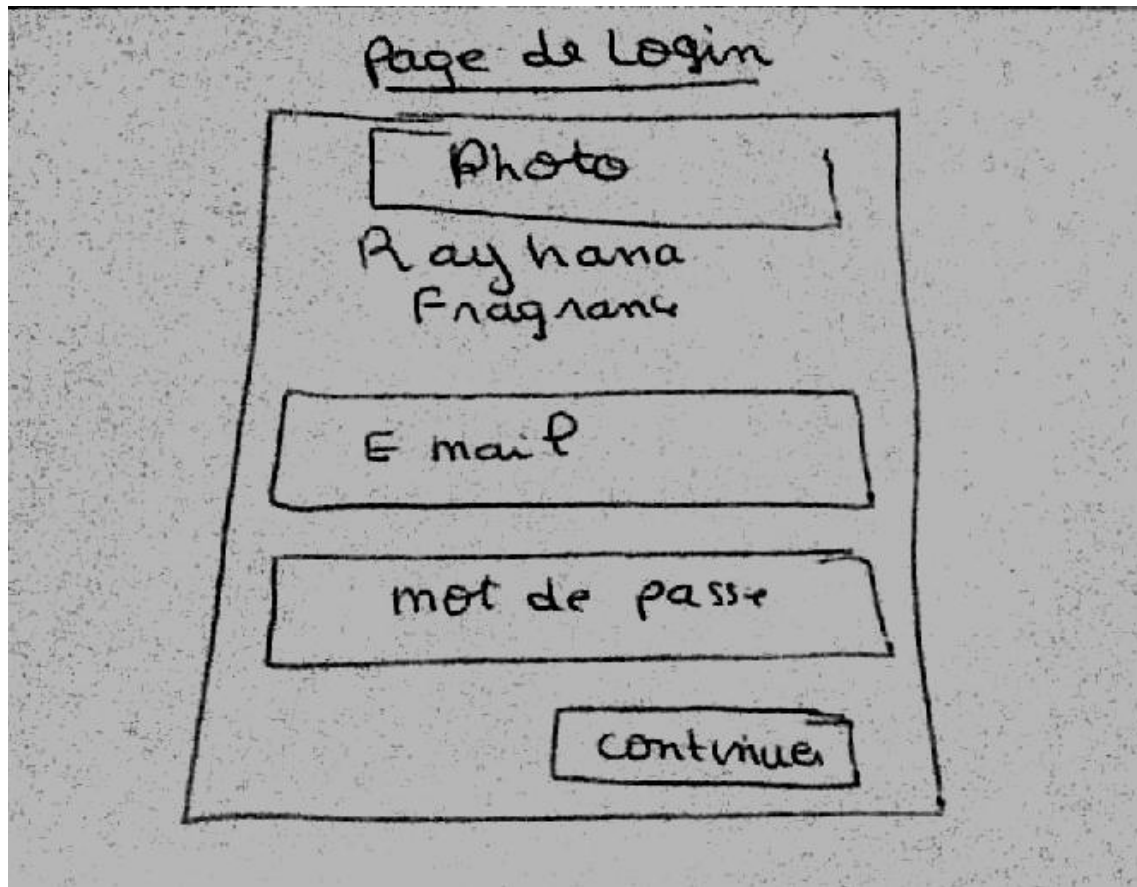

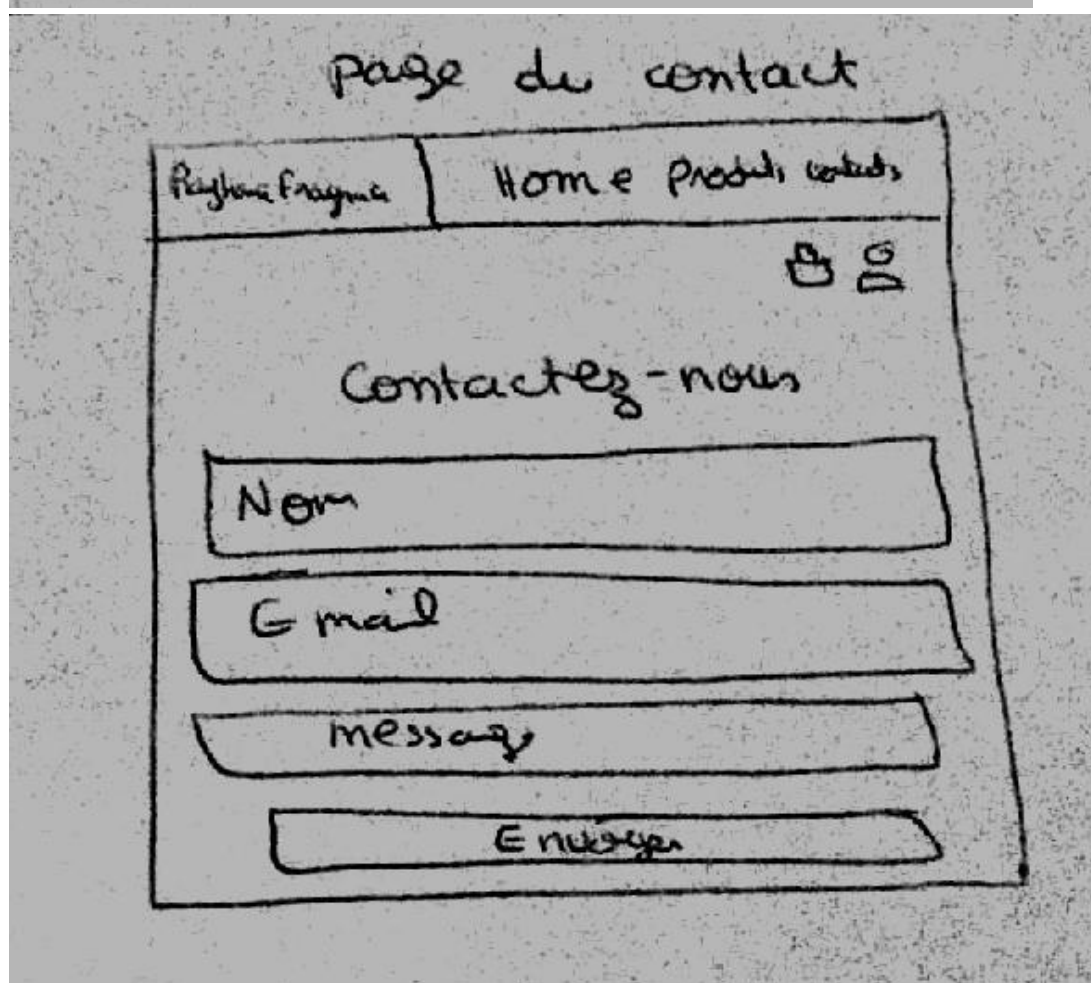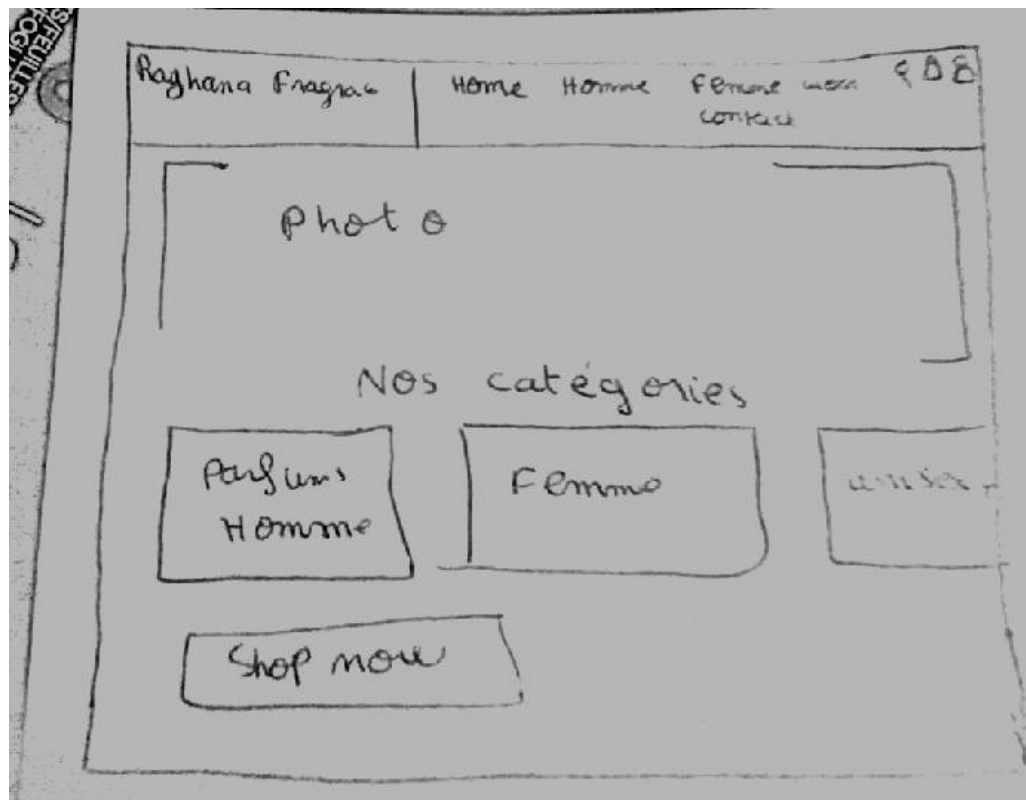

1.2.Exigences minimales

Must Have

Inscription Connexion

Catalogue des produits

Should Have

Recherche de produits

Gestion des produits

Could Have

Système d'avis clients

Won't Have

Application mobile

Paielement en ligne

Délai

Phase.	Durée
Analyse & CDC.	S1-S2
Conception.	S3-S4
Frontend.	S5-S7
Backend.	S8-S10
Tests	S11-S12

BE 2. Dictionnaire WBS

Code Tache Livrable

1.1.1 Analyse des besoins Document d'analyse:

1.1.2 Fonctionnalités Liste des fonction!

1.2.1 Wireframes Maquettes

1.2.2 Base de données Schéma BD

1.3.1 Page d'accueil Interface web

1.3.2 Catalogue Liste produits

1.3.3 Produits Détails produit

1.3.4 Panier Système panier

1.3.5 Authentification Login/Register

1.3.7 Commandes Gestion command

1.41 Tests Rapport de tests

1.4.2 Correction bugs Version finale

1.5.2 Mise en ligne Site déployé

BE 2. Dictionnaire WBS

2. Dictionnaire WBS

Tableau du projet

Code	Tâche	Livrable	Responsable	Durée estimée	Prédécesseur
1.1.1	Analyse des besoins	Document d'analyse	Rania	2 jours	Aucun

1.1.2	Identification des fonctionnalités	Liste des fonctionnalités	Ibtissam	1 jour	1.1.1
1.1.3	Rédaction CDC	Cahier des charges	Nouhaila	2 jours	1.1.2
1.2.1	Wireframes	Maquettes UI	Rania	3 jours	1.1.2
1.2.2	Conception BD	Schéma MySQL	Ibtissam	2 jours	1.1.3
1.3.1	Création page accueil	Interface accueil	Nouhaila	3 jours	1.1.2
1.3.2	Création catalogue	Liste produits	Rania	3 jours	1.1.2
1.3.3	Création page produit	Détails produit	Ibtissam	3 jours	1.3.1
1.3.4	Création panier	Système panier	Nouhaila	4 jours	1.3.3
1.3.5	Authentification	Login/Register	Rania	4 jours	1.2.2
1.3.6	Gestion produits	CRUD produits	Ibtissam	4 jours	1.3.5
1.3.7	Gestion commandes	Gestion commandes	Nouhaila	5 jours	1.3.4
1.4.1	Tests fonctionnels	Rapport tests	Toute l'équipe	3 jours	1.3.7
1.4.2	Correction bugs	Version finale	Toute l'équipe	3 jours	1.4.1
1.5.1	Préparation du serveur	Serveur configuré	Toute l'équipe	1 jour	1.4.2
1.5.2	Mise en ligne	Site déployé	Toute l'équipe	2 jours	1.4.2
1.5.3	Livraison finale	Projet final livré	Toute l'équipe	1 jour	1.5.2

Livrable2 :

1. Arbre WBS (Structure)

1.1 Spécification

1.1.1 Analyse des besoins

1.1.2 Identification des fonctionnalités

1.1.3 Rédaction du cahier des charges

1.2 Conception

1.2.1 Conception de l'interface utilisateur (wireframes)

1.2.2 Conception de la base de données

1.2.3 Architecture technique du site

1.3 Développement

Front-end

1.3.1 Création page d'accueil

1.3.2 Création page catalogue

1.3.3 Création page produits

1.3.4 Création panier

Back-end

1.3.5 Gestion des utilisateurs (login/register)

1.3.6 Gestion des produits

1.3.7 Gestion des commandes

1.4 Tests

1.4.1 Tests fonctionnels

1.4.2 Correction des bugs

1.4.3 Validation finale

1.5 Déploiement

1.5.1 Préparation du serveur

1.5.2 Mise en ligne du site

1.5.3 Livraison finale

Livrable 3 :

1.1 Spécification

1.2 Développement

1.3 Tests

1.4 Déploiement

3.1 Méthode A — Estimation par analogie

Projet

Site e-commerce de vente de parfums contenant :

Inscription / Connexion

Catalogue des parfums

Panier

Commandes

Espace admin amélioré

Interface moderne

Pas d'application mobile

Différence	impact	coefficient
Paielement à la livraison	simplifie	0.9
Notification email	complexifie	1.1
pas d'application	simplifie	0.8
Admin panel plus complet	complexifie	1.2
Technologie simple	neutre	1

Calcul étape par étape

$3 \times 0,9 \times 1,1 \times 0,8 \times 1,2 \times 1 = 2,85 \text{ mois} \approx 3 \text{ mois}$

Conclusion :

Nous retenons la méthode par analogie car elle correspond mieux à la taille de notre équipe (3 personnes) et au délai académique imposé.

Livrable 4 :

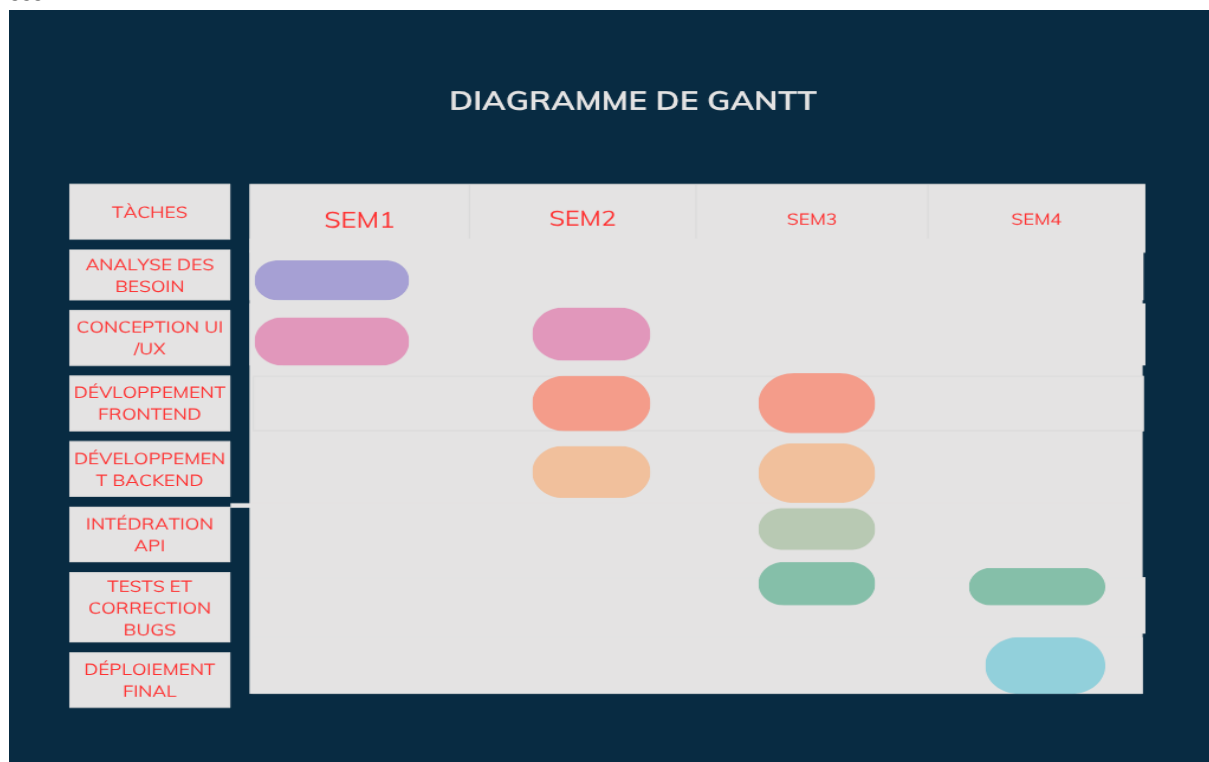


Tableau des marges :

Code	Tâche	Durée	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
1.1.1	Analyse des besoins	2 j	0	2	3	5	3 j
1.1.2	Identification des fonctionnalités	1 j	2	3	5	6	3 j
1.1.3	Rédaction CDC	2 j	3	5	14	16	11 j
1.2.1	Wireframes	3 j	3	6	23	26	20 j
1.2.2	Conception BD	2 j	5	7	16	18	11 j
1.3.1	Création page accueil	3 j	3	6	6	9	0 j
1.3.2	Création catalogue	3 j	3	6	23	26	20 j
1.3.3	Création page produit	3 j	6	9	6	9	0 j
1.3.4	Création panier	4 j	9	13	9	13	0 j
1.3.5	Authentification	4 j	7	11	18	22	11 j
1.3.6	Gestion produits	4 j	11	15	22	26	11 j
1.3.7	Gestion commandes	5 j	13	18	13	18	0 j

1.4.1	Tests fonctionnels	3 j	18	21	18	21	0 j
1.4.2	Correction bugs	3 j	21	24	21	24	0 j
1.5.2	Mise en ligne	2 j	24	26	24	26	0 j

Chemin critique

Les tâches avec une marge = 0 constituent le chemin critique :

1.3.1 → 1.3.3 → 1.3.4 → 1.3.7 → 1.4.1 → 1.4.2 → 1.5.2

Durée totale du projet : 26 jours.
